



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de
Aviação Civil


Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de
irregularidades graves constantes do PLOA 2018

**Obras de construção do Rodoanel/SP
Trecho Norte**

Brasília, 30 de novembro de 2017


Obras de construção do Rodoanel - Norte



Dados:

- UF: São Paulo
- UO: DNIT
- Funcional: Apoio à Construção do Rodoanel – Trecho Norte/SP – No Estado de São Paulo
- Convênio: Apoio financeiro ao Estado de São Paulo para execução de projetos, obras e serviços necessários à implantação do Rodoanel
- Contrato: Obras do Lote 02 do Rodoanel – Trecho Norte


Obras de construção do Rodoanel - Norte



Dados do contrato:

- Valor:
R\$ 627,5 mi (*ref. 2012*)
- Execução Físico-financeira:
78,93% (mai/17)

Obras de construção do Rodoanel - Norte




Proposta de indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (plGP)

1. Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado
2. Superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra
3. Alteração injustificada de quantitativos

Obras de construção do Rodoanel - Norte

1. Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado

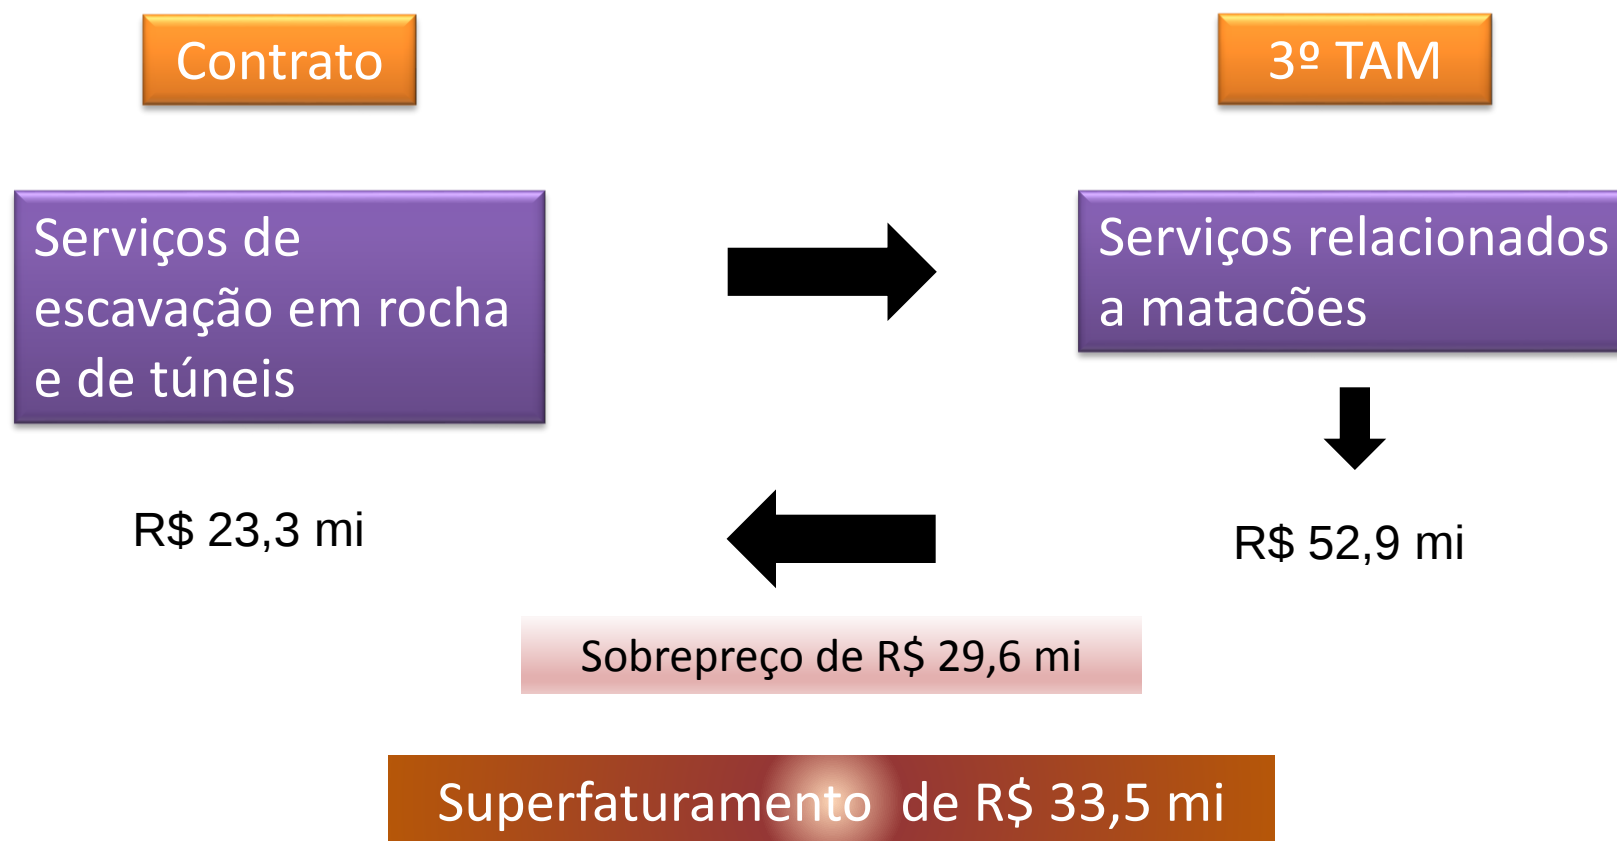


Valores de 2012



Obras de construção do Rodoanel - Norte

2. Superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra

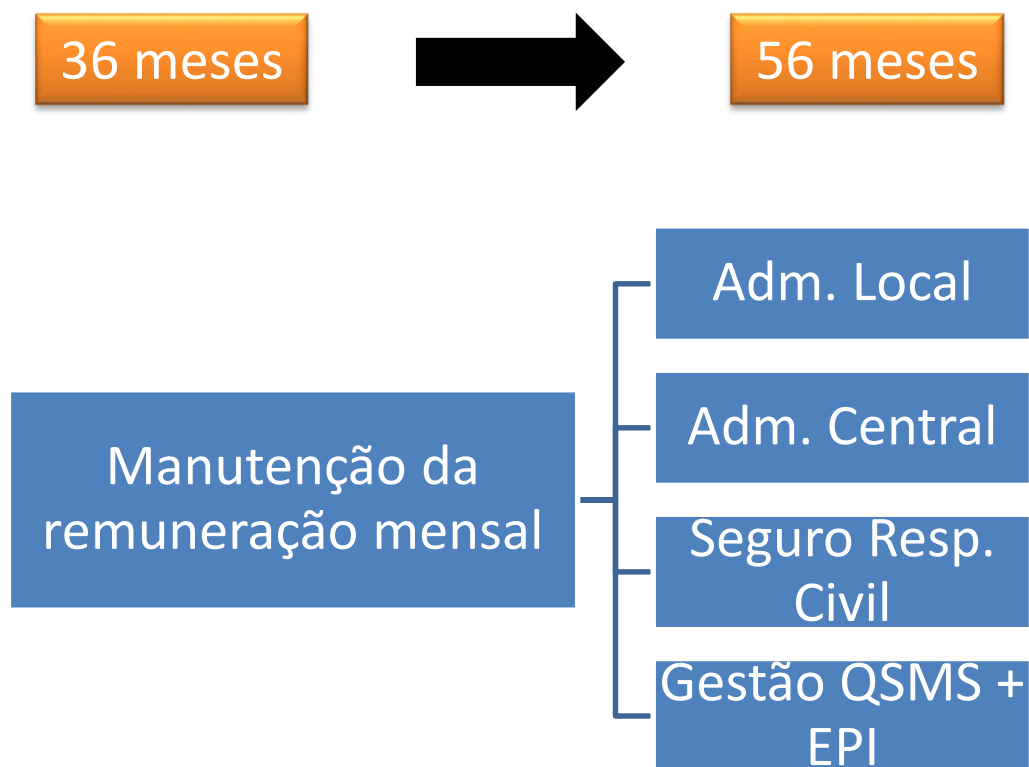

Valores de 2012

Obras de construção do Rodoanel - Norte

2. Superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra

36 meses

R\$ 29,4 mi

Deveriam se limitar a
R\$ 6,2 mi

Sobrepço de R\$ 23,2 mi

20 meses

R\$ 17,5 mi

Deveriam se limitar a
R\$ 3,7 mi

Sobrepço de R\$ 13,8 mi

Superfaturamento de R\$ 21,6 mi
(com reajustes)

Valores de 2012

Obras de construção do Rodoanel - Norte

3. Alteração injustificada de quantitativos

1º e 3º TAM

Acréscimo de serviços
novos e de quantidade de
serviços existentes

R\$ 218,5 mi (34,82%)




Impacto no contrato – R\$ 0,00

1º e 3º TAM

Acréscimo injustificado de
quantidades de serviços

Sobrepçoço de R\$ 39,8 mi

Obras de construção do Rodoanel - Norte



Situação Atual:

Não houve deliberação do TCU sobre o relatório de auditoria.

A manifestação preliminar da DERSA não enfrentou os achados 1 e 3.

Documentos complementares foram juntados ao processo em 29/11/2017.

Obrigado

aspar@tcu.gov.br
